


No.	作業	所用時間[分]	先行作業	後続作業
①	お米を研ぐ	3	—	②
②	米を炊く	45	①	③
③	ご飯をつぐ	2	②	⑨
④	肉を焼く	3	—	⑦
⑤	野菜を切る	10	—	⑥
⑥	野菜を炒める	5	⑤	⑦
⑦	具を煮る	10	④⑥	⑧
⑧	ルーを入れて煮る	5	⑦	⑨
⑨	カレーをかける	2	③⑧	—

クリティカルパス

# PERT図

(Program Evaluation and Review Technique)

プロジェクト中の個々のタスクの関連性を示す

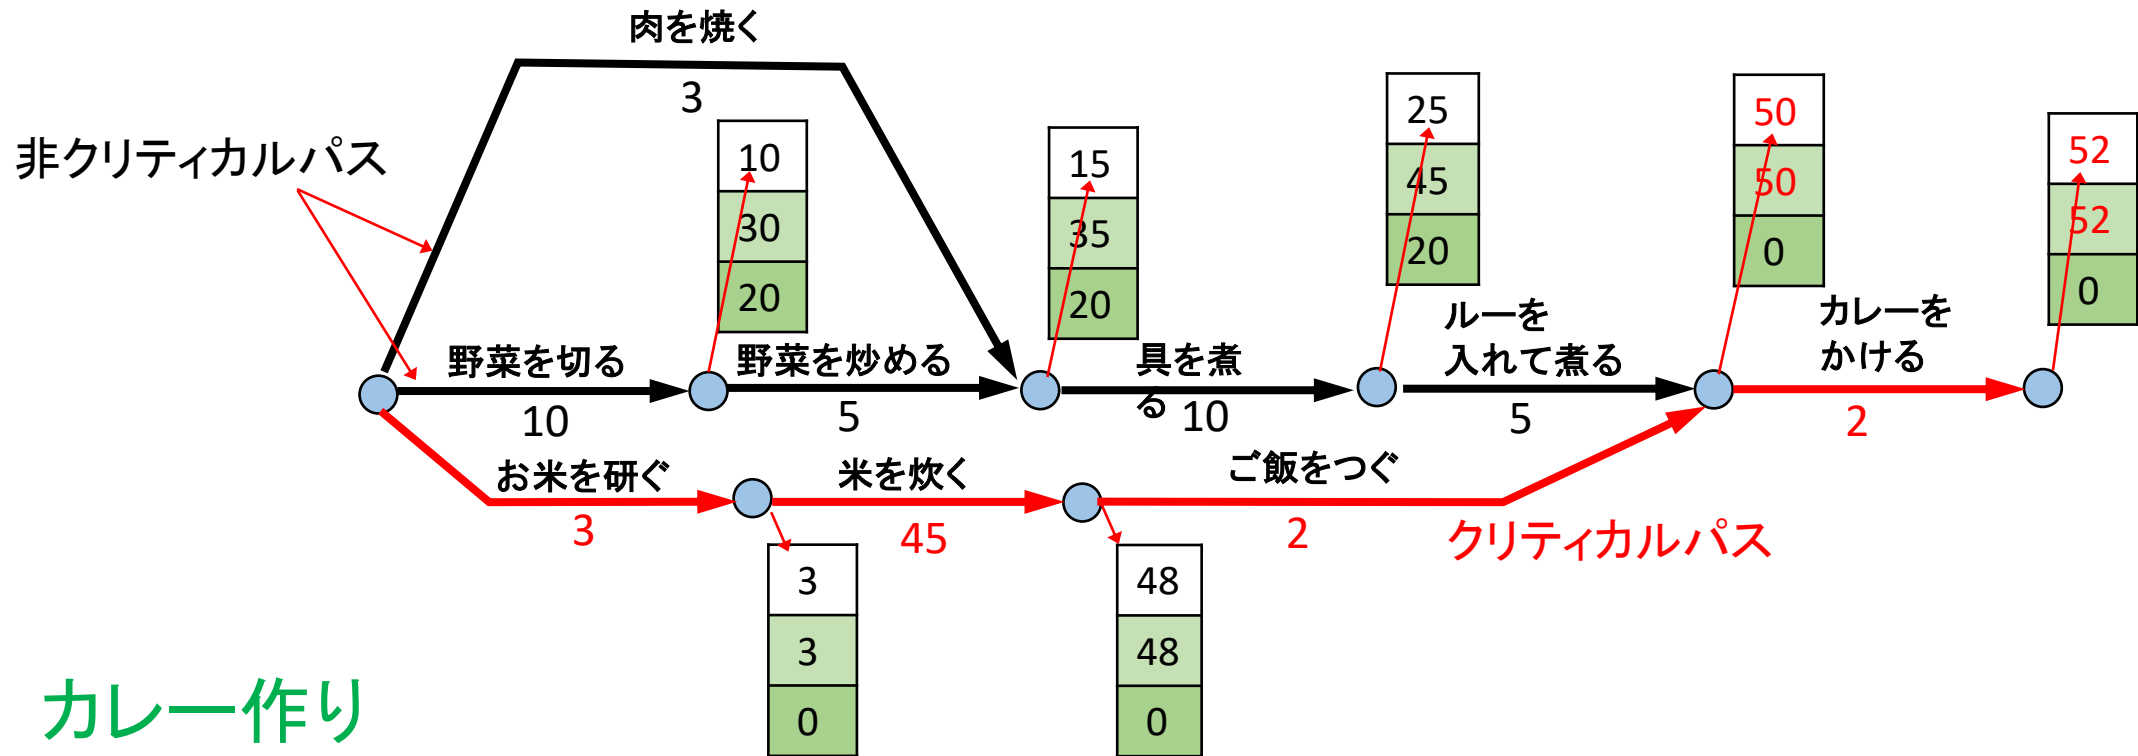

最早
最遅
余裕
